Baubereiche mit zeitlicher Planung
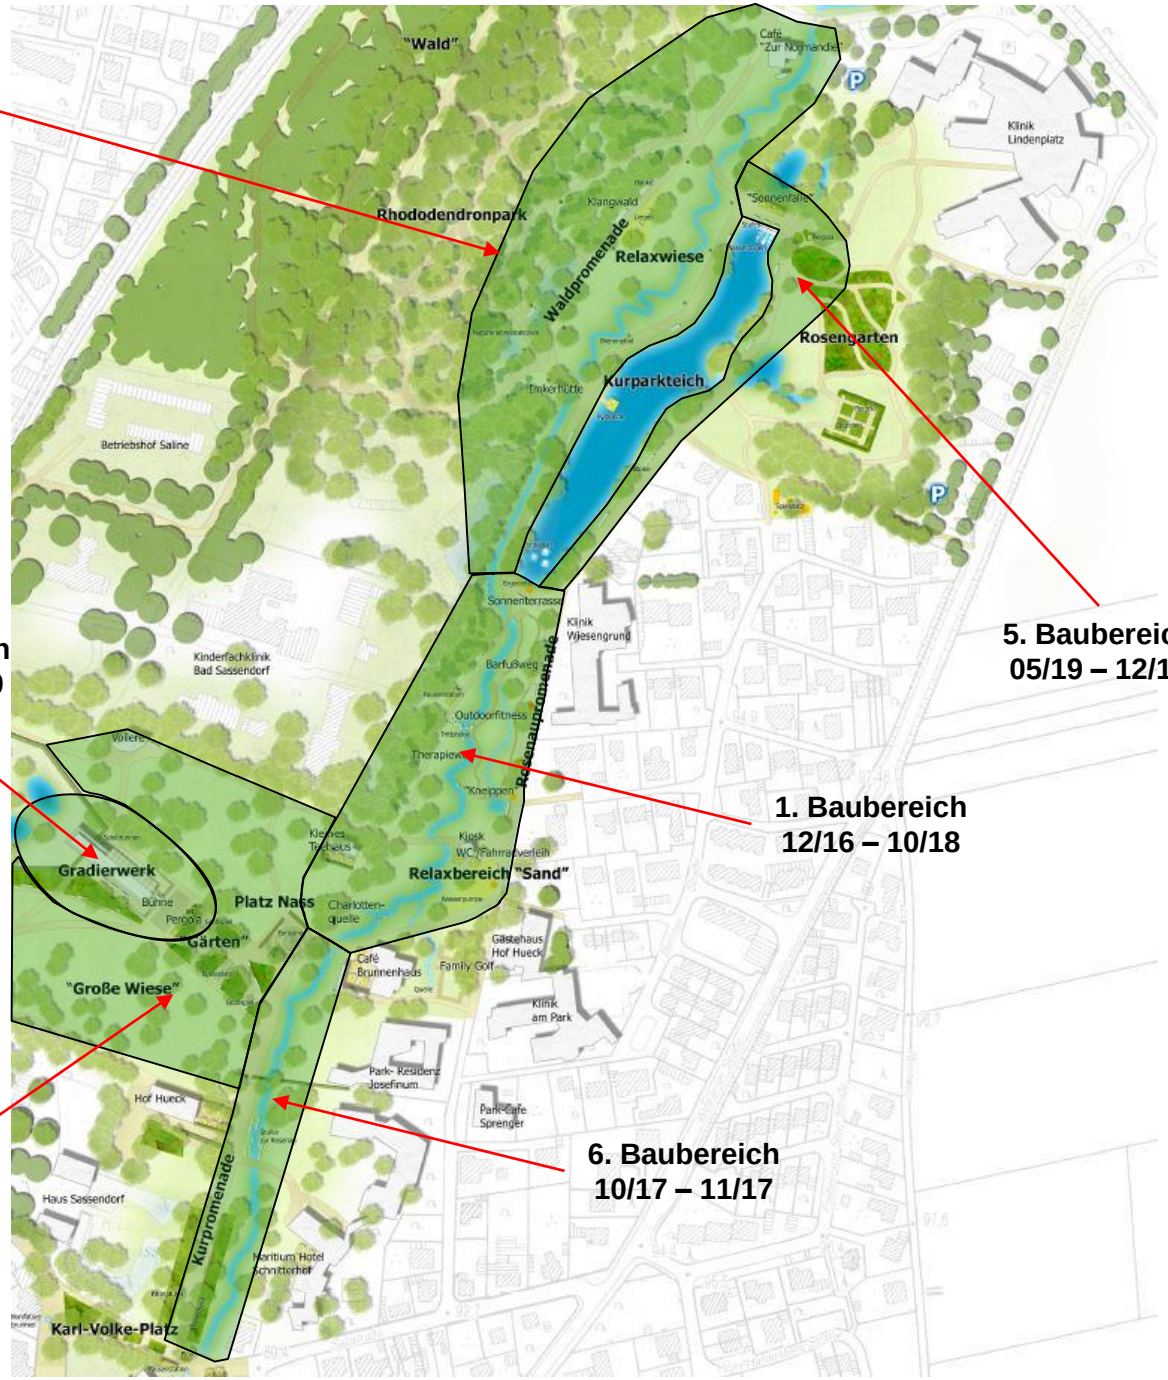
1. Baubereich →	**12/16 – 10/18**	**Status**
südl. Kurparkteich bis Café Brunnenhaus		
• Umlegung MW-Kanal	12/16 – 05/17	erledigt
• Renaturierung Rosenau	08/17 – 05/18	
• Umgestaltung Kurpark Charlotten-Lounge, Family-Golf, Relaxbereich Sand, Barfußpfad, Zugänge zur Rosenau, Therapieweg	06/18 – 10/18	
2. Baubereich →	**01/18 – 10/19**	
• Abriss und Neubau Gradierwerk	01/18 – 04/19	
• Aussenanlagen, Veranstaltungsfläche	05/19 – 10/19	
3. Baubereich →	**03/18 – 04/19**	
westlich Kurparkteich bis Normandie		
• Renaturierung Rosenau	03/18 – 09/18	
• Umgestaltung Kurpark Relaxbereich, Niedrigseilklettergarten, Mehrgenerationenspiele, Klangwald	10/18 – 04/19	
4. Baubereich →	**11/19 – 05/20**	
Bereich Gradierwerk bis Zugang Rosenau		
• Gartenspange, Großspiel, Bouleplatz	11/19 – 05/20	
5. Baubereich →	**05/19 – 12/19**	
nördlich und östlich vom Kurparkteich		
• Umgestaltung Kurpark, Platz und Zugang zum Kurparkteich, Promenade, Outdoorfitness	05/19 – 12/19	
6. Baubereich →	**10/17 – 11/17**	
Kurparkpromenade		
• Renaturierung der Rosenau	10/17 – 11/17
